FINANZIERUNG

UNSERE KOSTEN

Geplanter Aufwand

- Ursprüngliche Kalkulation: **185 Stunden**
- Herleitung: **80 h Entwicklung + 70 h Teamabstimmung + 35 h Planung**

Tatsächlicher Aufwand

- Bisher umgesetzt: **215,5 Stunden**
- Abweichung zum Plan: **+30,5 Stunden**
- Relative Abweichung: **ca. +16,5 %**

Aktuelle Kosten

- Kosten Sprint davor tatsächlich: **7.416,67 €**
- Kosten letzte Phase tatsächlich: **4.123,35 €**
- **Gesamtkosten aktuell: 11.540,02 €**

Aktueller Stand

- **Der Großteil der geplanten Funktionen wurde umgesetzt**
- **Noch nicht alle Features vollständig abgeschlossen**
- Zur Fertigstellung wird voraussichtlich **ein weiterer Sprint mit ca. 20 Stunden** benötigt

UNSERE AKTUELLE SITUATION

Warum Kosten-anstieg?

- Anfangs erfolgte die Kalkulation auf Basis einer frühen Aufwandsschätzung
- Im Projektverlauf zeigte sich ein höherer tatsächlicher Implementierungs- und Abstimmungsaufwand
- Durch spätere Nachträge wurde der reale Zeitbedarf vollständiger erfasst

Wirtschaftliche Einordnung

- Trotz Kostensteigerung wurde mit **11.540,02 €** bereits ein weitgehend funktionsfähiger Projektstand erreicht
- Der überwiegende Teil der geplanten Funktionen ist bereits umgesetzt
- Der aktuelle Betrag bezieht sich damit nicht auf ein theoretisches Konzept, sondern auf ein bereits weit entwickeltes System

Ausblick

- Für die letzten offenen Probleme wird ein zusätzlicher Sprint mit **ca. 20 Stunden** erwartet
- Bei Ansatz des kalkulierten Stundensatzes von **37,67 €/h** entspräche dies **ca. 753,40 €** zusätzlichem Aufwand
- Voraussichtlicher Gesamtaufwand nach Abschluss: **ca. 12.293,42 €**

VIELEN DANK!

Es folgt der Anhang it den vergangenen Präsentationen

AKTUELLER STAND (SPRINT 2)

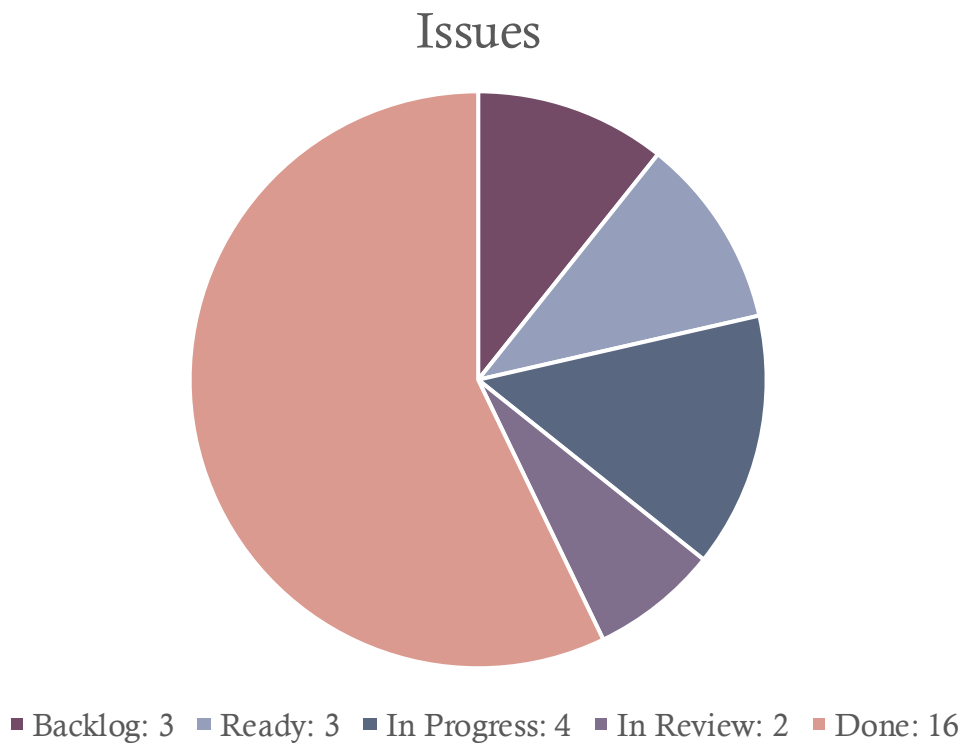

Projektwoche 7/8

Kosten bisher: 5.020 €

Done: 16 Issues
Todo: 12 Issues

AUSBLICK (SPRINT 3)

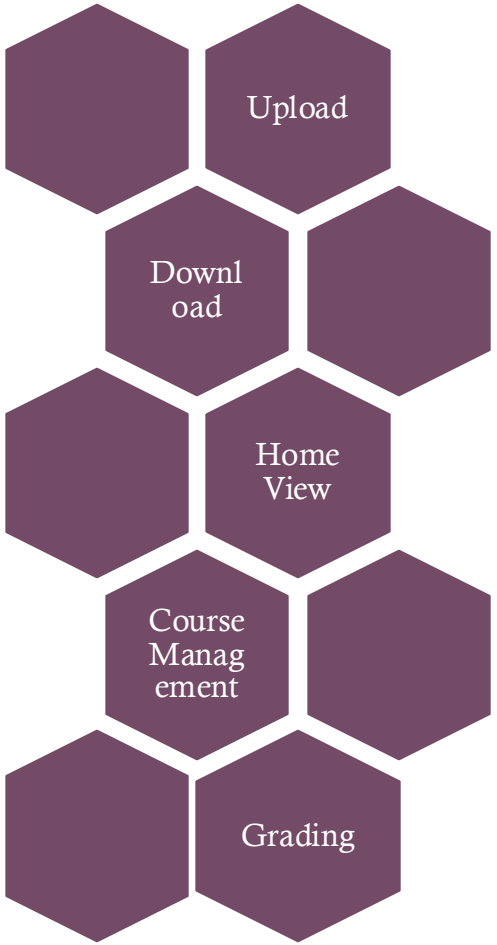

Kosten des kommenden Sprints: 3.012€

Geplant:
- Fertigstellen aktueller Issues
- Abarbeiten restlicher Issues

RENTABILITÄT

Andere Anwendungen

- **Singlepage m**it Angular oder React
  -> 20.000 - 100.000€
- Einfache Websites
  ->5.000 – 15.000€
- Komplexe Websites B2B
  ->20.000-100.000€

Unsere Projektkosten:

- Ca. 9.032€
- Anfangs berechnet: 9.996€ -> unter Budget!
- Deutlich unter Marktpreis
- Effiziente Eigenentwicklung

Investorennutzen:

- Vergleichsweise geringer Kapitaleinsatz
- Skalierbare Lösung
- -> Preis-Leistung als USP

VIELEN DANK

Es folgt der Anhang mit einer beispielhaften Kosten Herleitung

GRUNDKOSTEN

- **Gründung: 5200 €**
  - **(Rechts-) Beratung: 2500€**
  - **Anmeldung: 100€**
  - **Eintrag Handelsregister: 200€**
  - **Noter: 800€**
- **Geräte & Ausstattung: ~36.000€**

- **Entwicklungsumgebung Kostenfrei**
- **Frameworks: Kostenfrei**
- **SQL Server:**
  - **Hosting: Übernimmt Kunde**

PERSONALKOSTEN FÜR UNSERE ANWENDUNG

- **Einstiegsgehalt Software Engineer in Köln laut Kununu knapp 50.000€**
  - **-> Mit Nebenkosten 61.490€**
- **Bei 204 Arbeitstagen & 40 STD/Woche: 37,67€/Std pp**
- **32 Issues, gesch. Durchschnittliche Bearbeitungszeit: 2,5 Std**

- =80h Entwicklung
- + Teamabstimmung 70 h
- +Planung 35 h
- = 185h x 37,67€

== 6.968,95 €

UNSERE KOMPLEXITÄT

- Laut Piparo Tech – Entwicklungskosten Berechnung

- Für 10-25 Sichten
- Mit Nutzer Rechten
- Secruity Level: Standart

EINFLUSSFAKTOREN

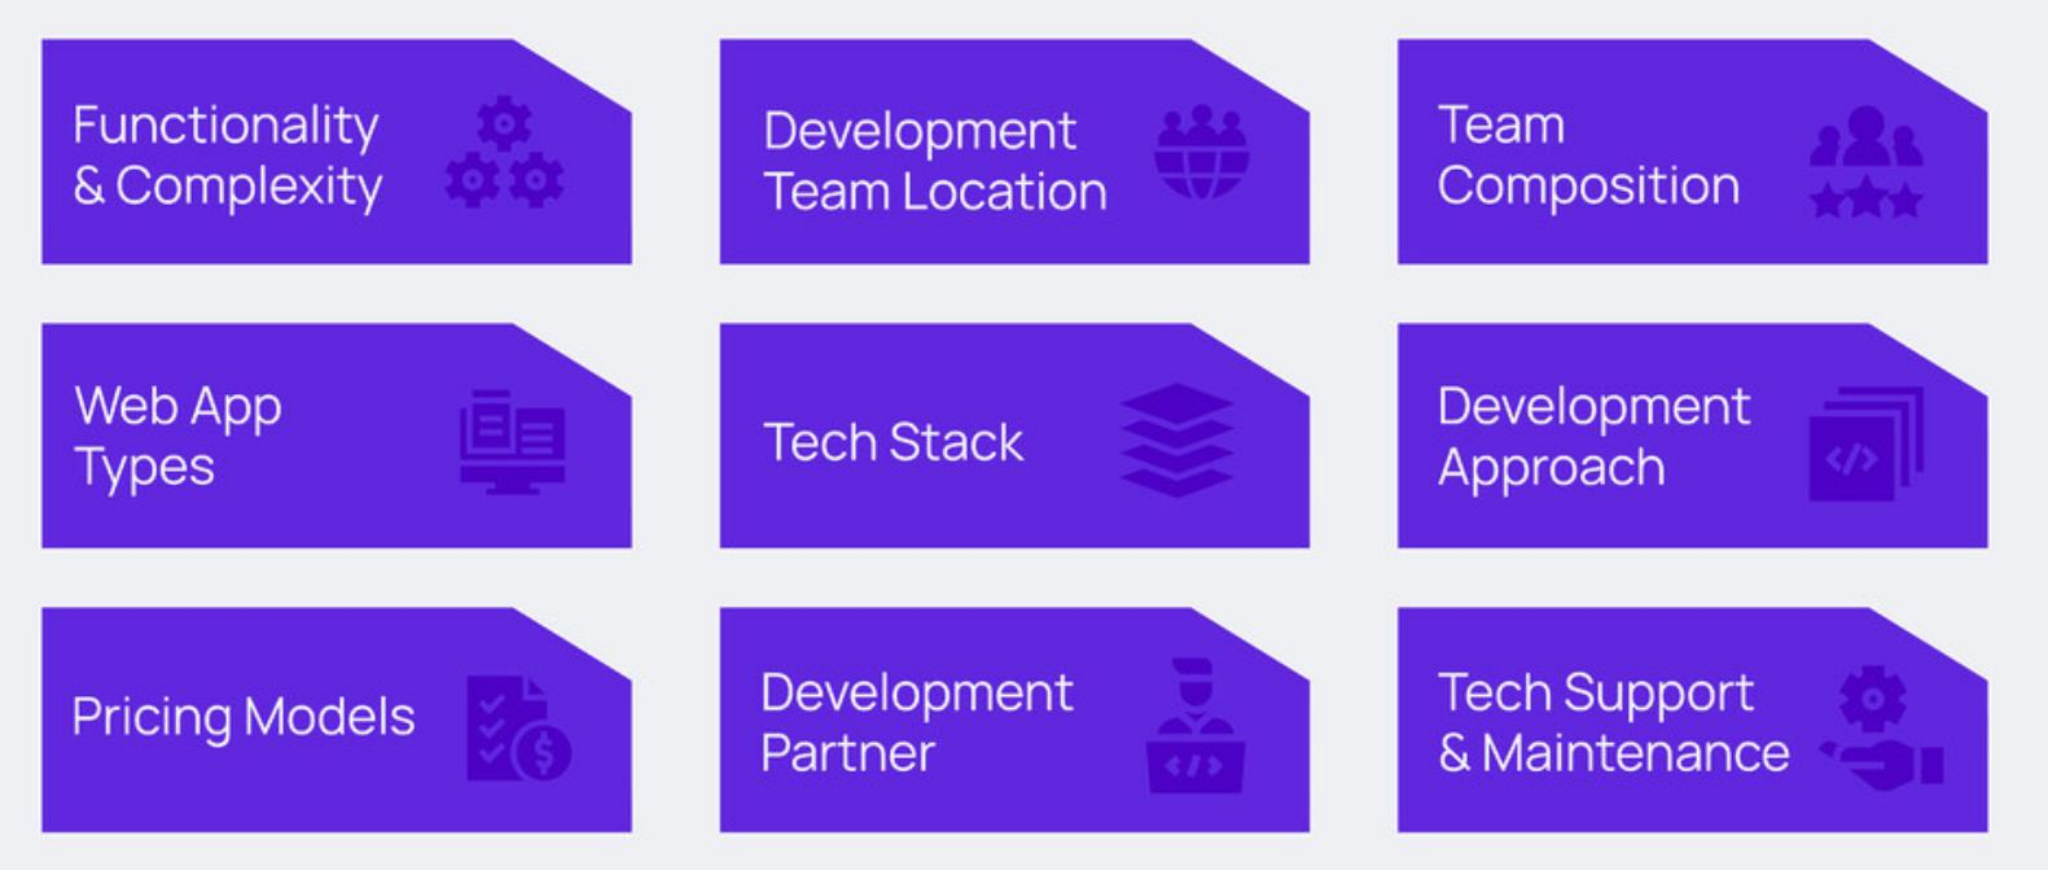

BEARBEITUNGSZEITEN

Priority	Business Need	Feature	Impact	Implementation Complexity	Timeline
1	Critical process inefficiency	Document management system	High: 40% time savings	Medium: 6-8 weeks	Q2 2025
1	Manual data entry errors	Digital forms & workflows	High: 65% error reduction	Low: 4-6 weeks	Q2 2025
2	Reporting delays	Real-time analytics dashboard	Medium: 25% faster decisions	Medium: 5-7 weeks	Q3 2025

PROJEKTGESAMTKOSTEN AM BEISPIEL DREMIX

- **Einfache Webanwendungen:**
  → ca. 10.000 € – 50.000 €
- **Mittlere Projekte (Individualsoftware):**
  → ca. 50.000 € – 150.000 €
- **Komplexe Systeme:**
  → ca. 150.000 € – 300.000 €
- **Unternehmens-Websndwendungen:**
  → ca100.000 € - 500-000€-

- **Singlepage-Anwendungen**
  - **Mit Angular oder Reat**
- **-> 20.000 - 100.000€**

"Kernfunktionen wie die Benutzerauthentifizierung können 40-60 Stunden Entwicklungszeit erfordern, während die Implementierung umfassender KI-Funktionen mehr als 200 Stunden in Anspruch nehmen kann."

PERSONALKOSTEN AM BEISPIEL DREMIX

"Beispielsweise berechnen Entwickler in den USA oder Westeuropa möglicherweise 100 bis 200 US-Dollar pro Stunde.

- =80h Entwicklung
- + Teamabstimmung 70 h
- +Planung 35 h
- = 185h x (1. 100, 2. 200€)

== 18.500€ - 37.000€

MINIMUM

PREISLISTE FÜR UNSERE ANWENDUNG

Nach Standarteinkommen:

PK 6.968,95 €
+ Gewinnzuschlag
***19%**
=9.996€

Nach Dremix:

37.000€
(+ GründungK & BM)
/ Verkaufte Lizenzen (3 in SW-Lifecycle)
+ Gewinnzuschlag 10%
***19%**
= ~66.409€

MÖGLICHE KOSTEN WÄHREND DER LAUFZEIT SUPPORT UND SQL SERVER HOSTING

- 5 – 5.000€ / Monat
- Eigene Webseite 25 €/ Monat
- Prof. Blog 25-75€ / Monat
- KMU Webseite 25-500€ /M
- ECommerce 750-5.000€ /M

- SQL Server 60 - 100€/Monat

MÖGLICHE KOSTEN OPTIMIERUNGEN

- **Auslagerung der Entwicklung:**
- **Gehälter von Angular Entwicklern:**
  - **Bulgarien: 18k-35k€**
  - **Ukraine: 15k-35k€**
  - **Portugal: 30k-55k€**
  - **Argentinien: 12k-30k**

QUELLEN

- Dremix: Arbeiten mit einer Webentwicklung Agentur: Komplette Kostenübersicht
- https://dreamix.eu/de/insights/webentwicklung-agentur-kostenuebersicht/?utm_source=chatgpt.com
- Piparo Tech: Kosten berechnen
- https://piparo.tech/
- Hostinger: Support Kosten
- https://www.hostinger.com/de/tutorials/kosten-fur-website-wartung#:~:text=Table_title:%20Kosten%20f%C3%BCr%20Website%2DWartung%20im%20Jahr%202026:,%7C%20Durchschnittliche%20monatliche%20Website%2DWartungskosten:%20200%E2%80%934.500%20%E2%82%AC/Monat%20%7C
